



CURSO VIRTUAL



Curso de especialización.


GESTIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS CON MS PROJECT

Certificado virtual y físico – 32 horas académicas



CEIC UNI
CENTRO DE CÓMPUTO

GESTIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS CON MS PROJECT PRESENTACIÓN

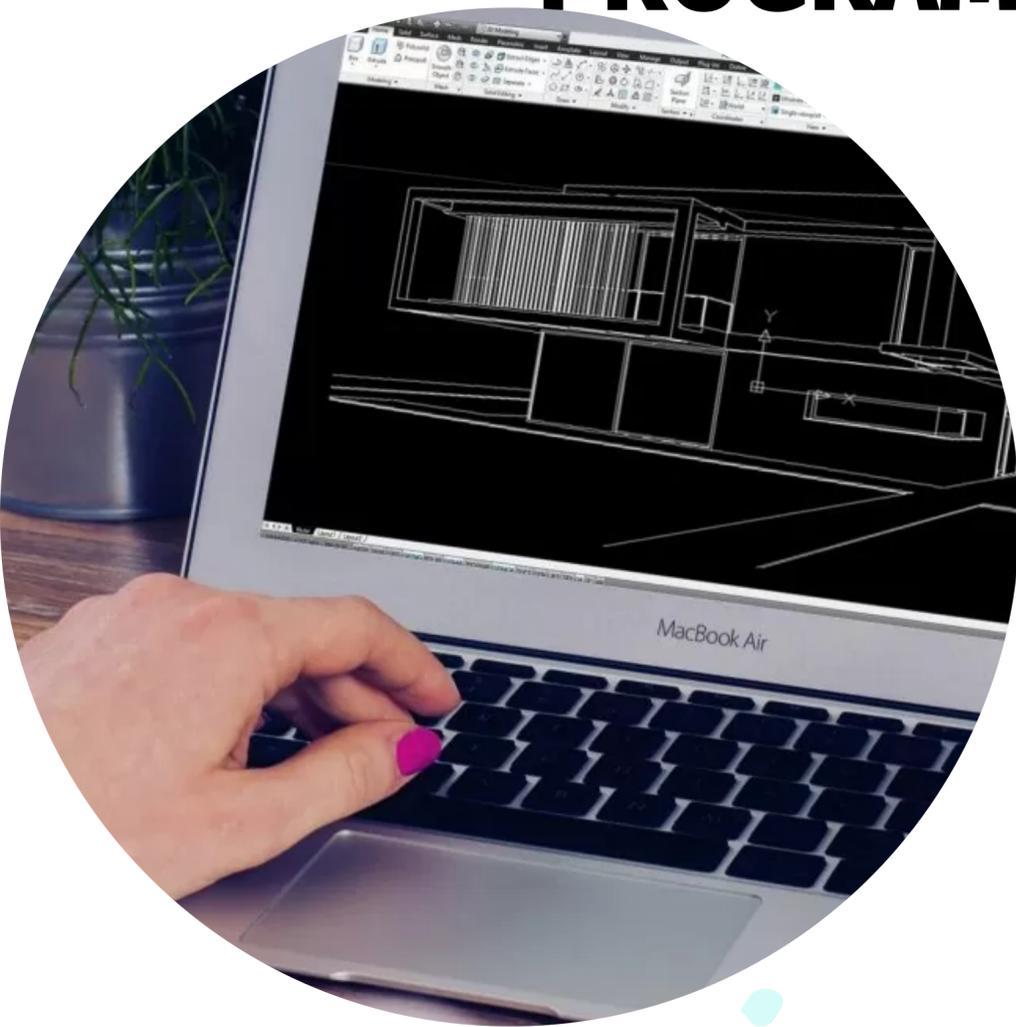

El curso está dirigido a los estudiantes y profesionales que están interesados en desarrollar la personalización de vistas, tablas y campos, uso de tablas, definir el método del valor ganado, determinando si estamos ganando o perdiendo económicamente en un proyecto y/o si estamos adelantados o retrasados.

DURACIÓN 32 HORAS

El programa de Project Profesional, es una herramienta para la planificación, control y seguimiento de proyectos. En el primer nivel tocamos la etapa de programación de proyectos donde definimos el calendario, estructura descomposición del Trabajo (EDT), las actividades, duraciones, recursos, costos, histogramas de recursos.

OBJETIVOS:

- Manejo a nivel profesional de Ms Project.
- Realizar el Seguimiento y Control del plan del proyecto
- Controlar las diferencias entre el plan previsto y la ejecución del proyecto
- Realizar informes del Estado del Proyecto

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES A PROJECT PROFESIONAL.

- **Ingresar.**
- **Comenzar un proyecto.**

CAPÍTULO 2: TRABAJOS POR TAREAS.

- **Lista de tareas e hitos.**
- **Vinculaciones tipos.**

CAPÍTULO 3: INGRESAR TAREAS.

- **Tipos de recursos.**
- **Determinar hojas de trabajo.**
- **Capacidad máxima de recursos.**

CAPÍTULO 4: ADMINISTRAR LAS TAREAS Y RECURSOS.

- **Modificación de recursos.**
- **Cambios de cantidad.**

CAPÍTULO 5: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.

- **Actualizar proyectos y líneas de base.**
- **Líneas de progreso.**



CAPÍTULO 6: VISTAS, USO DE TAREAS Y RECURSOS.

- **Uso de tareas y recursos.**
- **Redistribución de recursos y horas extras.**

CAPÍTULO 7: PERSONALIZAR VISTAS, TABLAS Y MOSTRAR DATOS CONDICIONADOS.

- **Crear vistas, tablas, campo.**
- **Autofiltros.**

CAPÍTULO 8: MÉTODO DEL VALOR GANADO.

- **Valor planificado.**
- **Valor ganado.**
- **Costo real.**
- **Análisis de valores principales.**

CAPÍTULO 9: CRONOGRAMA DE VALORIZADO DE OBRA.

- **Flujo de caja.**
- **Cronograma valorizado de obra.**

CAPÍTULO 10: CRONOGRAMA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CURVA S.

- **Cronograma de adquisición de materiales.**
- **Curva S.**



EVALUACIÓN DEL CURSO

MODALIDAD DE CALIFICACIÓN:

- 2 EVALUACIONES DURANTE EL CURSO

INVERSIÓN:

	Precio regular	Descuento del 20% 5 primeros inscritos
Público general:	S/. 300	S/. 240
Estudiante UNI:	S/. 250	S/. 200

EL COSTO INCLUYE LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO FÍSICO - VIRTUAL
Y ACCESO A LAS CLASES GRABADAS Y MATERIALES DEL CURSO

INFORMES E INSCRIPCIONES:

 946 598 685 / 981 147 989 / 938 254 164

MEDIOS DE PAGO:

- Cuenta BCP Soles: 19100603975074
- Cuenta interbancaria BCP: 00219110060397507456
- YAPE: 970102978 (Daniel Fernando Vega Meza)

CERTIFICA:

- CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL UNI

